

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001



Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón

(5) Unidad encargada	Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32
Encargado	Kenneth Solano Carmona
Teléfono / Correo	2202-5448 / kenneth.solano@conavi.go.cr
Fuente Financiamiento	Gobierno de la República Popular de China Contrapartida Nacional
Contratista/Supervisora	China Harbour Engineering Company Limited (CHEC)

(6) Descripción: Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). Duplicación y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construcción de intercambios (5 intercambios principales). Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovía, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto. Revisión sistema de drenajes.

(7) PLAZO	Orden de Inicio	14-dic-16	39.25%
	Plazo contractual (PC)	2601 días	
	Eventos compens. (EC)	222 días	
	Plazo por suspensión (PS)	0 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	2601 días	
	Última suspensión	N/A	
	Plazo utilizado	1021 días	% Avance
	Fecha de Finalización	24-ene-22	

(8) COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 543,482,137.07	33.43%
	Orden Modificación (OM)	\$ -	
	Reajustes (R)	\$ -	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 543,482,137.07	
	Financiero Ejec.	\$ 181,659,978.05	% Ejec.
	Pendiente de pago (PP)	\$ -	

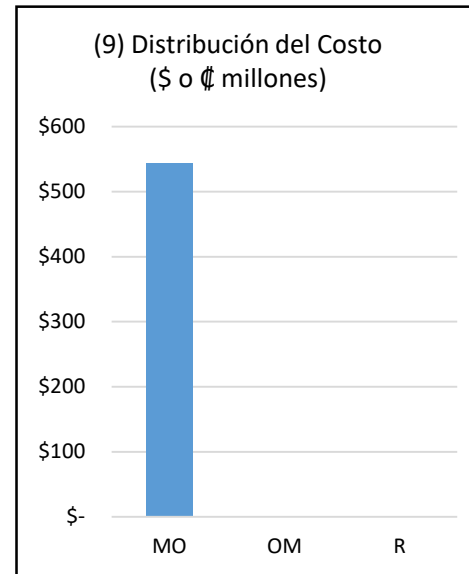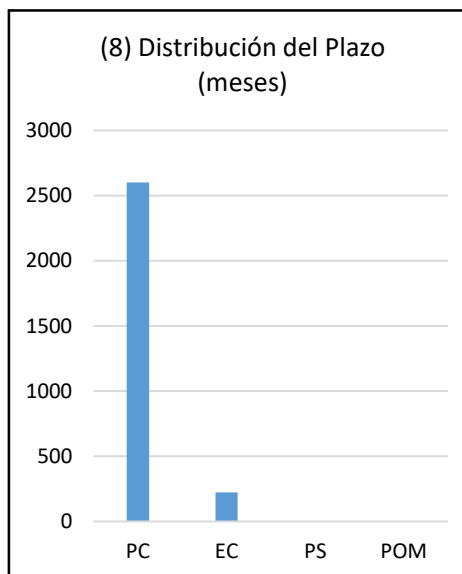

(9) Consideraciones relevantes

A junio 2020, el proyecto en la etapa de diseño y la etapa de construcción consumió el 79.09% del plazo contractual y se cuenta con un 21.45% de avance físico real.

A continuación, se muestra por etapa el avance del plazo y financiero:

Etapa diseño de obras: El proyecto consumió el 100% del plazo contractual y se cuenta con un 90% de avance financiero.

Etapa construcción de obras: El proyecto consumió el 74.26% del plazo contractual. Con respecto al costo, el proyecto se planificó con un 84.22% de avance financiero (a octubre 2020) y se cuenta con un 22.11% de avance. Ver cuadro de "Situación actual de las actividades/obras y avance físico" del informe Gerencial para el Consejo de Administración de Diseño + Construcción.

(10) Elaborado y aprobado por:

Arquitecto del Proyecto:

Gerente del Proyecto:

(4) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.


(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Curva S

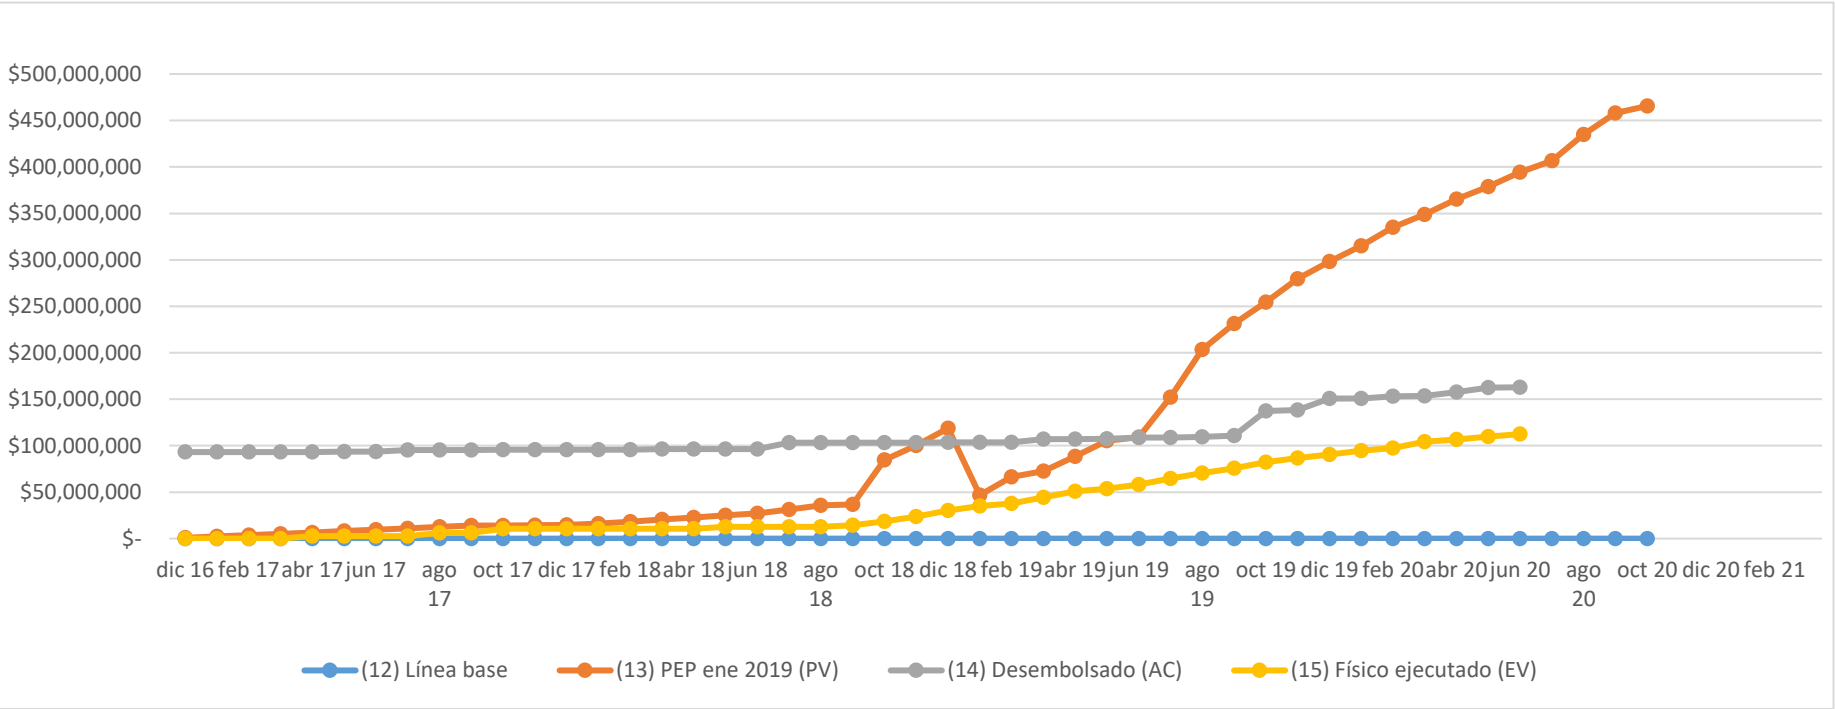

Flujo de desembolsos

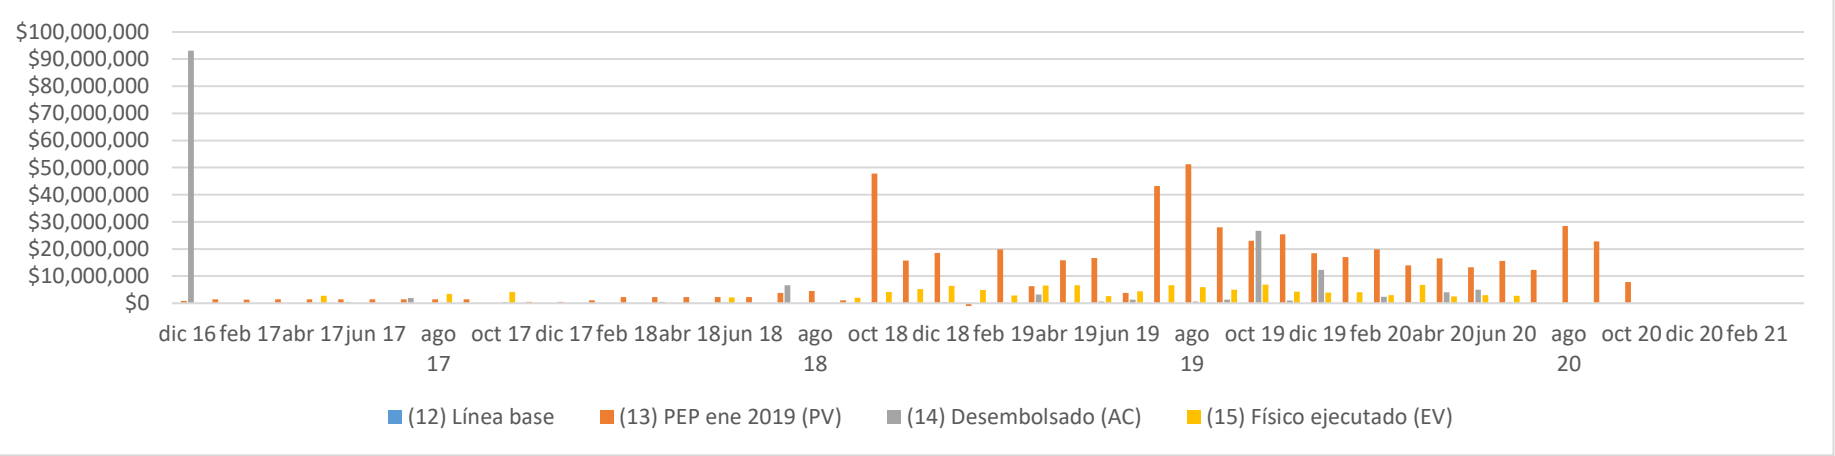


(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1)Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

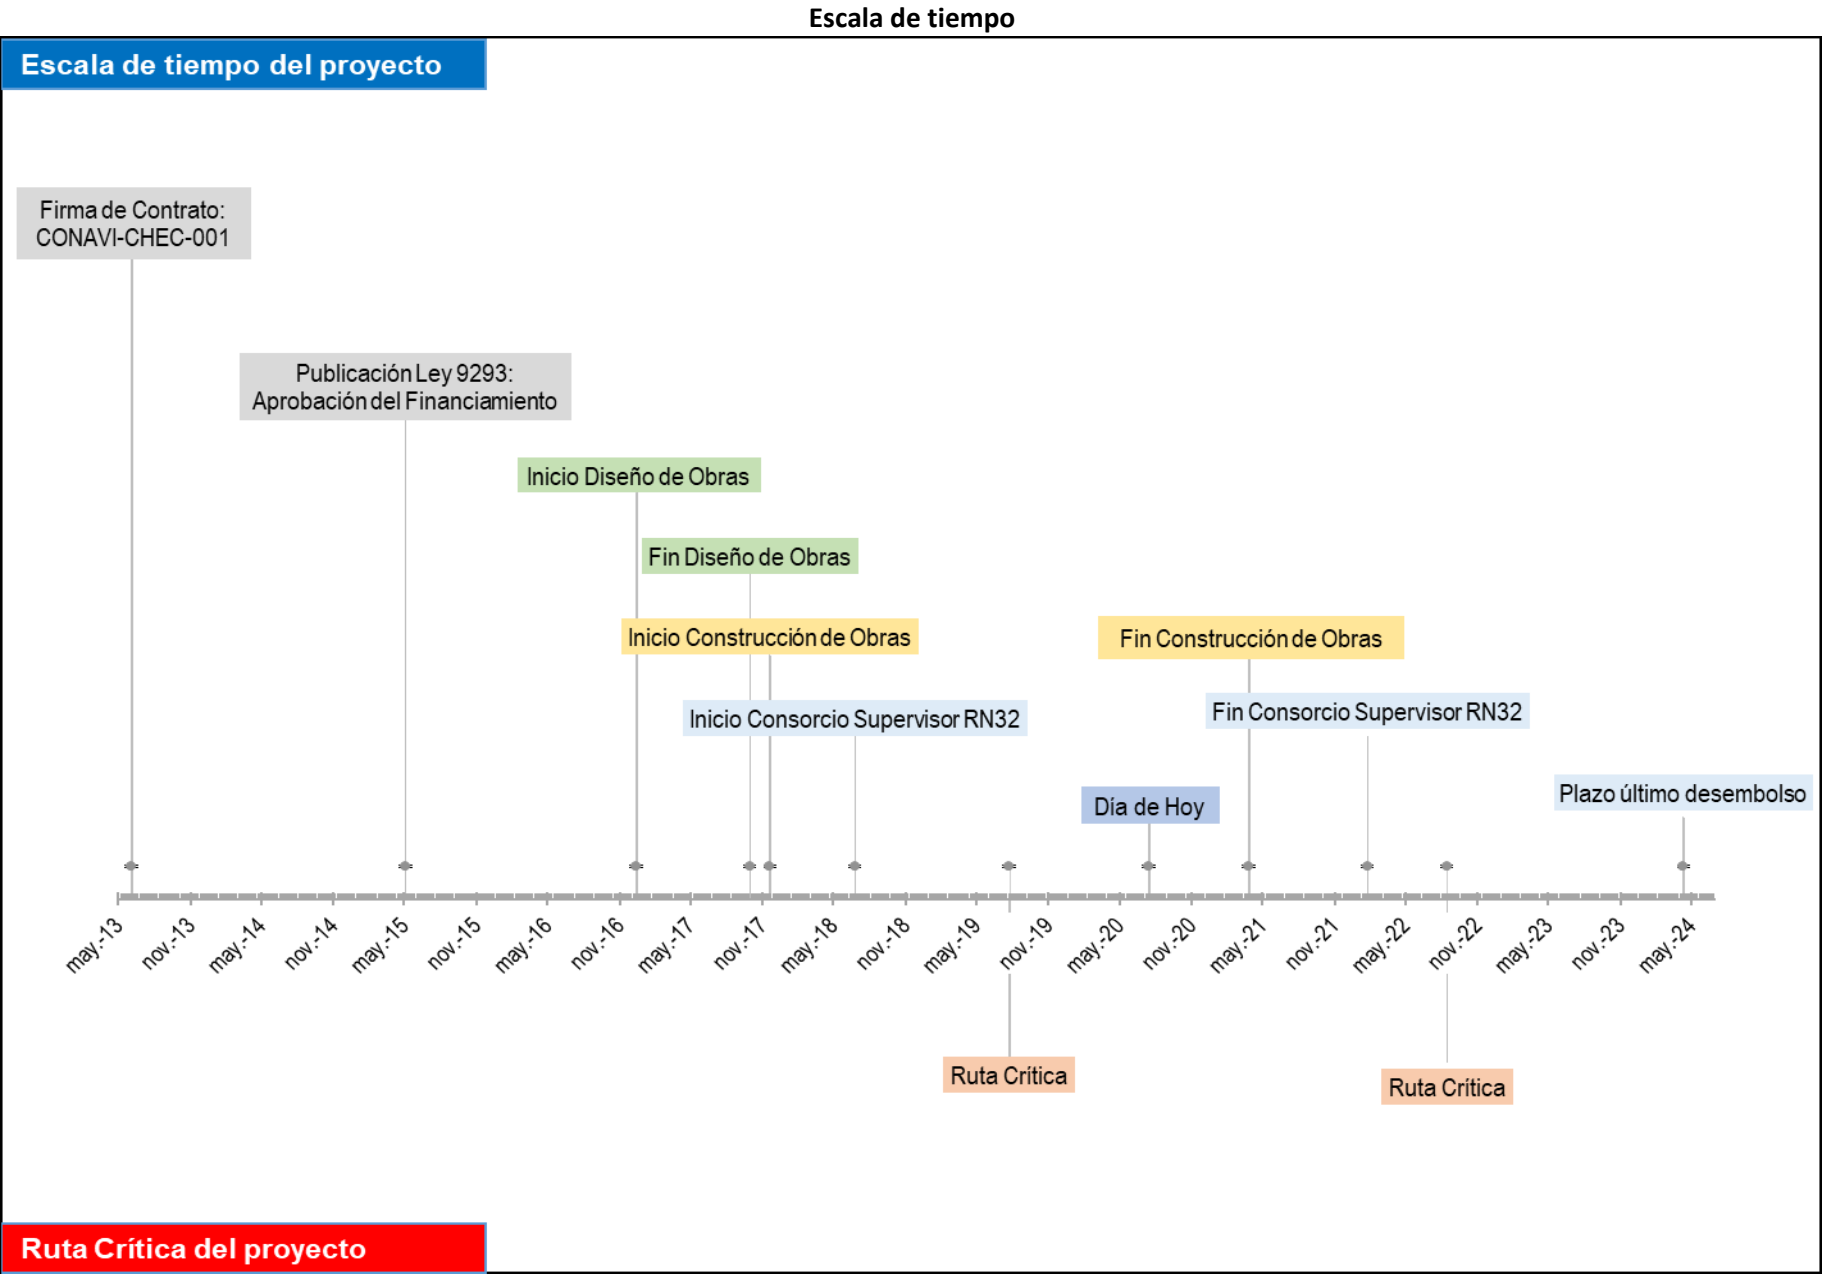

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Tareas Críticas

Id	% completado	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	2º trimestre abril mayo	3er trimestre junio julio	4º trimestre agosto septiembre	1er trimestre octubre noviembre diciembre	2º trimestre enero	3er trimestre febrero marzo	4º trimestre abril
1	45%	1	Proyecto: Rehabilitación y ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón (工程名称)	14 dic '16	15 ago '22	2071 días				Jun 30 mar '20			
9	45%	1.2	Proceso de Construcción de Obras (工程施工开始)	20 nov '17	15 ago '22	1730 días							
16	50%	1.2.3	Tramo 1: Cruce Ruta 4 Km 49+299-Pococi Km 67+800 (Rama 1) (段落一: 四号路口里程 Km 49+299 - 到 Pococi 里程 Km 67+800, 一分部)	30 ene '18	1 oct '21	1340 días							
861	52%	1.2.4	Tramo 2: Pococi Km 67+800-Guácimo Km 84+340 (Rama 1) (段落二: 從 Pococi 里程 Km 67+800 - 到 Guácimo 里程 Km 84+340, 一分部)	9 mar '18	15 dic '21	1378 días							
1273	40%	1.2.5	Tramo 3: Guácimo Km 84+340-Siquirres Km 110+400 (Rama 1) (段落三: 從 Guácimo 里程 Km 84+340 - 到 Siquirres 里程 Km 110+400, 一分部)	4 jun '18	15 ago '22	1533 días							
1275	40%	1.2.5.2	Km 84+340-km 86+500 (Rama 1) (一分部)	11 jul '18	31 oct '21	1208.25 días							
1277	8%	1.2.5.2.2	Estructura de Pavimento, sección tipo 1 (路面工程施工)	15 jun '19	31 oct '21	869.25 días							
1278	0%	1.2.5.2.2.1	Riesgo: Diseño de obras + Adquisición de tierras y reubicación de instalaciones públicas (风险: 设计+征地和公共设施迁移造成延迟)	13 jun '19	9 ene '20	208 días							
1307	0%	1.2.5.2.4	Retornos (回转车道)	2 abr '20	28 ene '21	301 días							
1607	34%	1.2.5.5	Km 95+000-km 104+000 (Rama 1) (一分部)	10 ago '18	15 ago '22	1466 días							
1656	0%	1.2.5.5.4	Retornos (回转车道)	19 ene '21	14 jun '21	146 días							
1657	0%	1.2.5.5.4.1	Inicio de actividades (施工开始)	19 ene '21	19 ene '21	0 días							
1658	0%	1.2.5.5.4.2	km 102+800 里程	19 ene '21	14 jun '21	146 días							
1902	45%	1.2.5.6	Km 104+000-km 110+400 (Rama 1) (一分部)	16 dic '18	1 jul '22	1293.75 días							
1904	21%	1.2.5.6.2	Estructura de Pavimento, sección tipo 1 (路面工程施工)	9 ene '20	31 oct '21	661.25 días							
1907	27%	1.2.5.6.2.3	Obras de subrasante (路基施工)	9 ene '20	7 jun '21	515 días							
1911	0%	1.2.5.6.2.3.4	Drenaje (排水)	6 sep '20	7 jun '21	274 días							
1952	0%	1.2.5.6.4	Retornos (回转车道)	8 ene '21	26 feb '22	414 días							
1953	0%	1.2.5.6.4.1	Inicio de actividades (施工开始)	8 ene '21	8 ene '21	0 días							
1954	0%	1.2.5.6.4.2	km 108+286.576 里程	8 ene '21	7 jun '21	150 días							
2076	49%	1.2.6	Tramo 4: Siquirres Km 110+400-Matina Km 135+200 (Rama 2) (段落四: 從 Siquirres 里程 Km 110+400 - 到 Matina 里程 Km 135+200, 二分部)	9 mar '18	23 may '22	1537 días							
2082	52%	1.2.6.3	km 110+400-Km 115+000 (Rama 2) (二分部)	15 jul '18	2 mar '21	960.75 días							
2084	14%	1.2.6.3.2	Estructura de Pavimento, sección tipo 1 (路面工程施工)	2 jun '19	22 oct '20	507.75 días							
2086	0%	1.2.6.3.2.2	Adquisición de tierras y reubicación de instalaciones públicas (征地和公共设施迁移)	1 may '20	1 may '20	0 días							
2087	19%	1.2.6.3.2.3	Obras de subrasante (路基施工)	2 jun '19	21 oct '20	506.99 días							
2135	60%	1.2.6.4	km 115+000-Km 118+700 (Rama 2) (二分部)	9 mar '18	9 ago '21	1250 días							
2216	52%	1.2.6.5	km 118+700-Km 125+100 (Rama 2) (二分部)	9 mar '18	23 may '22	1537 días							
2437	38%	1.2.6.6	km 125+100-Km 133+126 (Rama 2) (二分部)	20 abr '18	25 jun '21	1162 días							
Nombre del archivo: 20200327 PEP RN32 Interseccion RN4-Limon-CR-SEV-FINAL-06-15-20							Nombre del proyecto: Rehabilitación y Ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón (工程名称)						
							Fecha 30 mar '20						
							Página 1 / Página 2						

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Tareas Críticas

Id	% completado	EDT	Nombre de tarea	Comienzo	Fin	Duración	2º trimestre abril	3er trimestre mayo	3er trimestre junio	4º trimestre julio	4º trimestre agosto	4º trimestre septiembre	1er trimestre octubre	1er trimestre noviembre	2º trimestre diciembre	2º trimestre enero	3er trimestre febrero	3er trimestre marzo	4º trimestre abril
2598	45%	1.2.6.7	km 133+126-Km 135+200 (Rama 2) (二分部)	20 abr '18	21 oct '21	1281 días													
2731	31%	1.2.7	Tramo 5: Matina Km 135+200-Limón Km 156+534 (MECO Y H. SOLIS) (段落五: 從Matina 里程 Km 135+200 - 到 Limón 里程 Km 156+533) (MECO 和 H.SOLIS)	9 mar '18	15 ago '22	1621 días													
2751	43%	1.2.7.5	Km 135+200-Km144+820 (Hernán Solís) (里程 Km 135+200-Km144+820 (Hernán Solís))	7 may '18	15 ago '22	1562 días													
2753	38%	1.2.7.5.2	Estructura de Pavimento (路面工程施工)	22 oct '18	2 jul '22	1349 días													
2759	22%	1.2.7.5.2.3	Obras de pavimento (路面结构层施工)	6 dic '18	2 jul '22	1304 días													
2761	0%	1.2.7.5.2.3.2	Riesgo: Inicio tardío de actividades (Fresado y nivelación capa asfalto existente) (CHEC) (风险: 既有路面刨除和高程调整平整施工开工晚)	28 mar '21	9 abr '21	12 días													
2770	60%	1.2.7.5.3	Alcantarillas (管道排水施工)	8 may '19	1 ago '20	452 días													
2843	0%	1.2.7.5.7	Obras de Seguridad Vial (道路安全工程)	23 oct '18	15 ago '22	1393 días													
2851	0%	1.2.7.5.7.2	Bahías de autobuses (巴士车站)	15 dic '21	15 ago '22	244 días													
2864	0%	1.2.7.5.7.2.13	Km 144+700, 100 mts Oeste de entrada plantel Hídralchi (里程 Km 144+700, Hídralchi 工厂入口)	5 ago '22	15 ago '22	10 días													
2865	0%	1.2.7.5.7.2.14	Fin de actividades (施工完成)	15 ago '22	15 ago '22	0 días													
2866	0%	1.2.7.5.7.3	Ciclovías (自行车道)	23 oct '18	26 ago '21	1039 días													
2867	0%	1.2.7.5.7.3.1	Inicio de actividades (施工开始)	23 jul '20	23 jul '20	0 días													
2868	0%	1.2.7.5.7.3.2	km 142+400-Km 144+300, sección tipo 2 (路面设计断面种类 2, 里程 km 142+400 到 里程 km 144+300)	23 jul '20	27 ago '21	400 días													
2869	0%	1.2.7.5.7.3.3	Riesgo: Fin demorado de actividades (Ciclovías) (CHEC) (风险: 自行车道施工结束日期延迟)	28 mar '21	27 ago '21	152 días													
2870	0%	1.2.7.5.7.3.4	Fin de actividades (施工完成)	27 ago '21	27 ago '21	0 días													
2876	0%	1.2.7.5.9	Fin de actividades (施工完成)	15 ago '22	15 ago '22	0 días													
2877	16%	1.2.7.6	Km144+820-Km 156+534 (Meco) (里程 Km144+820-Km 156+534 (Meco))	9 mar '18	11 abr '22	1494 días													
2895	26%	1.2.7.6.3	Alcantarillas (管道排水施工)	17 jul '19	1 dic '20	504 días													
2897	3%	1.2.7.6.3.2	Km 145+608 o (里程)	17 jul '19	15 jun '20	334.42 días													
2898	3%	1.2.7.6.3.3	Km 146+319 o (里程)	31 jul '19	22 jun '20	327.62 días													
2899	0%	1.2.7.6.3.4	Km 146+817 o (里程)	22 jun '20	9 jul '20	17 días													
2900	3%	1.2.7.6.3.5	Km 147+630 NO (22-feb-19) o (里程)	1 sep '19	17 jul '20	320.02 días													
2901	67%	1.2.7.6.3.6	Km 147+988 NO (22-feb-19) o (里程)	17 sep '19	18 jul '20	305.52 días													
3085	0%	1.2.7.7	Fin de actividades (施工完成)	15 ago '22	15 ago '22	0 días													
3086	0%	1.2.8	Fin de Ejecución de Obras (工程执行结束作业)	15 ago '22	15 ago '22	0 días													

Nombre del archivo: 20200327 PEP RN32 Intersección RN4-Limón CHEC-SE/PLAN AL-04-1512
Nombre de proyecto: Rehabilitación y Ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ruta Nacional No. 32, sección: Intersección con la Ruta Nacional No. 4-Limón (工程名称)
Fecha 30 mar '20
Página 2 / Página 2

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Resumen estado de expropiaciones

TRAMOS	TRONCO PRINCIPAL							INTERSECCIONES - PSV - RETORNOS															TOTAL DE PROYECTO		
	T1	T2	T3	T4	T5	Sub Total Terrenos	% Avance	PSV Union	PSV Dantas	PSV Sinal	IC Guapiles	PSV Molino	PSV Jiménez	PSV Guadmo	PSV Pocora	PSV Franda	IC Sigüesres	PSV MATINA	TOM	Sub Total Terrenos	% Avance	Total de Terrenos	TOTAL Avance	%	
TOTAL DE PREDIOS IDENTIFICADOS A LA FECHA	48	36	103	38	25	250	100%	9	5	16	5	15	38	3	4	4	0	12	8	100	100%	350	100%		
TOTAL PRESENTADOS RN	48	35	103	38	8	232	93%	9	4	16	5	15	38	3	4	4	0	12	8	100	100%	332	95%		
TOTAL INSCRITOS	47	34	93	38	8	220	88%	1	3	16	5	15	37	3	4	4	0	12	6	97	97%	317	91%		
Gestoria Trabaja en el Montaje de los Expedientes para Entregarlos a la UE																									
TRAMOS	T1	T2	T3	T4	T5	Sub Total Terrenos	% Avance	PSV Union	PSV Dantas	PSV Sinal	IC Guapiles	PSV Molino	PSV Jiménez	PSV Guadmo	PSV Pocora	PSV Franda	IC Sigüesres	PSV MATINA	TOM	Sub Total Terrenos	% Avance	Total de Terrenos	TOTAL Avance	%	
Expedientes entregados al DABI por parte de la Unidad Ejecutora	39	29	77	35	7	187	75%	0	0	13	4	12	19	2	0	3	0	6	0	55	55%	242	69%		
Notificación a Propietarios de inicio de proceso de Expropiación	39	29	62	33	7	170	68%	0	0	12	4	12	13	2	0	3	0	5	0	47	47%	217	62%		
Solicitud de Declaratoria de Interés Publico - Jurídico MOPT	39	28	62	32	7	168	67%	0	0	12	4	12	13	2	0	3	0	5	0	47	47%	215	61%		
DIP Enviados al Despacho por Juridico	39	28	51	27	7	152	61%	0	0	11	3	11	13	2	0	3	0	5	0	45	45%	197	56%		
Resoluciones Firmadas por el Ministro	38	28	46	26	6	144	58%	0	0	10	2	10	13	2	0	3	0	5	0	43	43%	187	53%		
Resoluciones Publicadas en GACETA	37	28	43	25	6	139	56%	0	0	10	2	9	13	2	0	3	0	5	0	42	42%	181	52%		
Comunicación Avalúo Administrativo a Propietario	30	26	22	24	4	106	42%	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	7	7%	113	32%		
Aceptacion de Avalúo	22	21	14	15	3	75	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	75	21%		
NO Aceptación de Avalúo	7	5	6	6	1	25	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1%	26	7%		
Pendiente de Respuesta de Avaluó	1	0	2	3	0	6	2%	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	2	0	6	6%	12	3%		
Entrada en Posesión Voluntaria	2	2	1	3	1	9	4%	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	2%	11	3%		
Solicitud de Fondos -Proceso Rápido	12	11	6	12	2	43	17%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	43	12%		
Acuerdo de Expropiación- Proceso Lento	17	15	14	9	2	57	23%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1%	58	17%		
Terrenos A Nombre del estado	11	12	4	7	0	34	14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	34	10%		
Entrada en Posesión	5	2	1	2	1	11	4%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	11	3%		
														TOTAL DE TERRENOS ADQUIRIDOS								45	13%		

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
OS-1 14-dic-16	8 meses	Inicio de la Etapa I: Diseño del Proyecto	N/A	N/A	Aprobada
OS-2 08-set-17	48 días	Traslado de la fecha prevista para la entrega de los diseños definitivos del proyecto	N/A	N/A	Aprobada
OS-3 20-nov-17	34 meses	Inicio de la Etapa II: Construcción del Proyecto	N/A	N/A	Aprobada
OS-4 31-ago-18	N/A	N/A	\$20,000,000.00	Traslado del servicio público que brinda el AyA (incluyendo ASADAS) + expropiaciones	Aprobada
OS-4 Enmienda 04-abr-19	N/A	N/A	Incluido dentro del monto OS-4	Gastos administrativos-financieros que incurre el Contratista para suplir los servicios de la presente Orden de Servicio	Aprobada
OS-5 07-jun-19	N/A	N/A	Incluido dentro del monto OS-4	Traslado del servicio público que brinda RECOPE	Aprobada

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Servicio

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
OS-6 01-nov-19	N/A	N/A	Incluido dentro del monto OS-4	Demolición y construcción de las acometidas para los medidores eléctricos del ICE	Aprobada
OS-8 27-ene-20	N/A	N/A	Incluido dentro del monto OS-4	Cubrir los trabajos que ordene la ingeniería de Proyecto, para la Deconstrucción de 2 Puentes Peatonales existentes sobre la Ruta Nacional No. 32	Aprobada

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Modificación

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
OM-1 19-nov-18	N/A	Modifica los parámetros de las especificaciones del diseño de la Mezcla Asfáltica en Caliente	N/A	N/A	Aprobada
OM-2 13-jun-19	N/A	Cambia la figura de Regente Ambiental del contratista a Gestor Ambiental del Contratista	N/A	N/A	Aprobada
OM-3 30-set-19	N/A	Ajustar cantidades de varios ítems de acuerdo al plan de inversión	N/A	N/A	Aprobada
OM-4 02-mar-20	N/A	Trabajos para el traslado de servicios públicos AyA (incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del proyecto.	N/A	N/A	Aprobada

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de Órdenes de Modificación

(16) Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
OM-5 04-may-20	N/A	Trabajos para el traslado del servicio público que brinda el AyA (Incluyendo las ASADAS), en los lugares donde sea requerido y dentro de los límites del Proyecto	N/A	N/A	Aprobada
OM-6 18-may-20	N/A	Se modifica los siguientes parámetros de las especificaciones del diseño de la Base Estabilizada con cemento (BE-25), de acuerdo con las variaciones de presente OM	N/A	N/A	Aprobada

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Alcantarillas



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Arqueología



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Cunetas



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Gaviones



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Laboratorio



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Limpieza



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Mejoramiento de suelos



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Cruce Río Frío



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Guápiles



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Plantel Barbilla



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente peatonal Km 72+975.256



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 1: Km 50+975.80, Río Corinto



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 2: Km 54+.30088, Río Costa Rica



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 3: Km 56+187.60, Río Blanco



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 4: Km 57+334.70, Río Danta



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 5: Km 59+124.70, Río Toro Amarillo



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 6: Km 64+884.60, Río Molinos



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 7: Km 67+336.80, Río Jiménez



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 8: Km 67+512.60, Río Roca



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 9: Km 73+75.605, Río Guácimo



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 10: Km 74+049.90, Río Guacimito



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 11: Km 78+187.80, Río Parismina



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 12: Km 83+035.30, Río Dos Novillos



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 13: Km 84+269.70, Río Destierro



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 14: Km 89+283, Río Dos Vueltas



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 15: Km 94+023.20, P. Sup. Ferrocarril



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 16: Km 94+288.30, Río Reventazón



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 17: Km 97+118.30, Río Siquirres



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 18: Km 99+668.15, Río Pacuare



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 21: Km 107+814.90, Río Hondo



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 22: Km 109+666.50, Río Madre de Dios



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 23: Km 115+506.30, Río Barbilla



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 25: Km 121+444.70, Río Aguas Claras



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 26: Km 123+456.90, Río San Miguel



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 27: Km 125+308.60, Río Chirripó



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente 28: Km 133+109.20, Río Escondido



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 29: Km 133+953.50, Río Cuba



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 30: Km 134+857.80, Río Rojo



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puentes 31: Km 135+075.00, Río Toro



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Retorno Km 135+787



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Retorno Km 151+943



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.
Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Reubicación de servicios públicos



Latitud: 9.995806
Longitud: -83.163113
Elevación: 26.11m
Precisión: 5.4m
Tiempo: 04-06-2020 15:36
Nota: km140+820 LI. I.C.E

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 15 de julio de 2020.

Periodo que reporta: Junio 2020.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Tramos de prueba



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.
