


Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| \$ 363.30 | \$ 231.24 | \$ 331.36 | \$ 451.63 | \$ -31.94 | \$ 100.12 | 2007 días | 0.91 | 1.43 | 0.55 |
| PV | AC | EV | BAC | SV | CV | EACt | SPI | CPI | TCPI |

| | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|
| PLAZO | Orden de Inicio | 20-nov-17 | 93% |
| | Plazo contractual (PC) | 1049 días | |
| | Eventos compens. (EC) | 857 días | |
| | Plazo por suspensión (PS) | 0 días | |
| | Plazos OM (POM) | 0 días | |
| | Plazo total (PC+EC+POM) | 1049 días | |
| | Última suspensión | N.A. | |
| | Plazo utilizado | 979 días | % |
| Fecha de Finalización | 08-feb-23 | Avan. | |

| | | | |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|
| COSTO | Monto de oferta (MO) | \$ 451.63 | 51% |
| | Orden Modificación (OM) | \$ - | |
| | Reajustes (R) | \$ - | |
| | Monto total (MO+OM+R) | \$ 451.63 | |
| | Financiero Ejec. | \$ 231.24 | % |
| | Pendiente de pago (PP) | \$ 24.24 | Ejec. |

| | |
|----------------------|------------------|
| Fuente Financiamier | Costa Rica/China |
| Contratista/Supervis | CHEC |

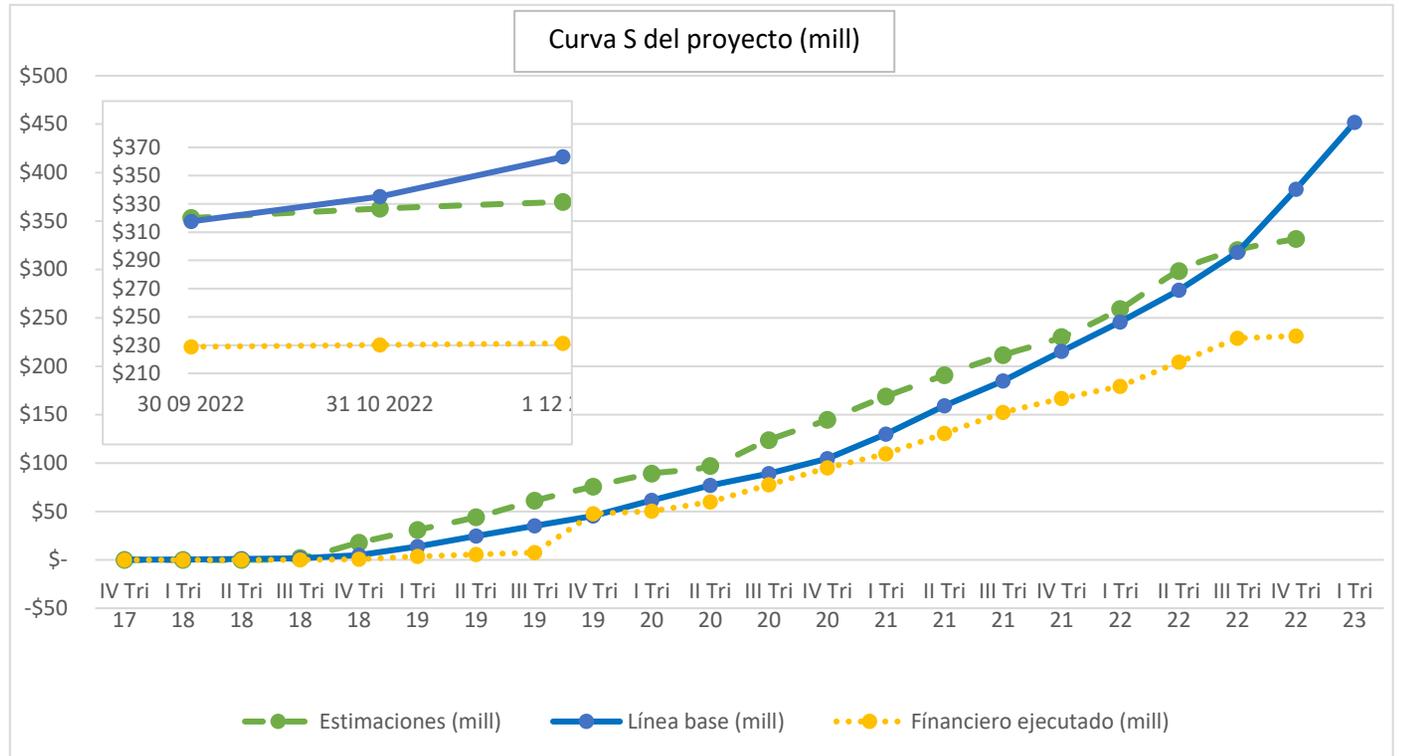

Fotografía



Consideraciones relevantes

Mediante O.S. No. 13 de CHEC, se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 08 de febrero de 2023 por eventos compensables al Contratista

Sólo se va a realizar en análisis de valor ganado en ésta línea ya que es la rehabilitación y construcción de obra que es una de las etapas más fuertes del proyecto y se está ejecutando en estos momentos

Según un cronograma elaborado por la Unidad Ejecutora RN32 (UERN32), si los procesos de expropiaciones se mantienen con los tiempos que están durando en el DABI, PGR, JCA y que están fuera del alcance de la UERN32, la última propiedad se tiene una proyección que la estarían entregando para el 02 de abril de 2024

