


Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón

\$ 361.66	\$ 289.23	\$ 368.89	\$ 451.63	\$ 7.23	\$ 79.66	2286 días	1.02	1.28	0.51
PV	AC	EV	BAC	SV	CV	EACt	SPI	CPI	TCPI

PLAZO	Orden de Inicio	20-nov-17	90%
	Plazo contractual (PC)	1049 días	
	Eventos compens. (EC)	1258 días	
	Plazo por suspensión (PS)	0 días	
	Plazos OM (POM)	0 días	
	Plazo total (PC+EC+POM)	1049 días	
	Última suspensión	N.A.	
	Plazo utilizado	852 días	%
Fecha de Finalización	15-mar-24	Avan.	

COSTO	Monto de oferta (MO)	\$ 451.63	64%
	Orden Modificación (OM)	\$ -	
	Reajustes (R)	\$ -	
	Monto total (MO+OM+R)	\$ 451.63	% Ejec.
	Financiero Ejec.	\$ 289.23	
	Pendiente de pago (PP)	\$ 2.67	

Fuente Financiamier	Costa Rica/China
Contratista/Supervis	CHEC

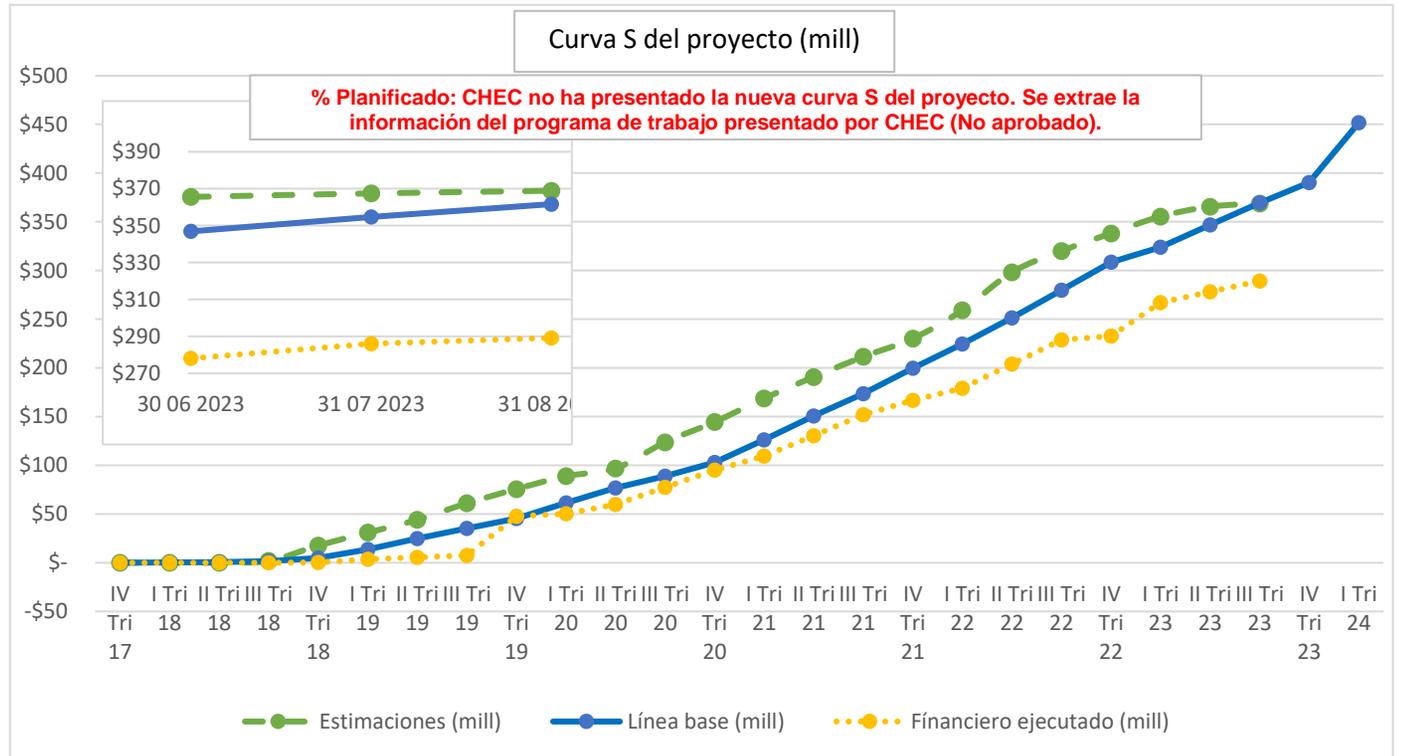

Fotografía



Puente peatonal Km 123+120

Consideraciones relevantes

Mediante O.S. No. 16 de CHEC, se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día 15 de marzo de 2024 por eventos compensables al Contratista

Sólo se va a realizar en análisis de valor ganado en ésta línea ya que es la rehabilitación y construcción de obra que es una de las etapas más fuertes del proyecto y se está ejecutando en estos momentos

Según un cronograma elaborado por la Unidad Ejecutora RN32 (UERN32), si los procesos de expropiaciones se mantienen con los tiempos que están durando en el DABI, PGR, JCA y que están fuera del alcance de la UERN32, la última propiedad se tiene una proyección que la estarían entregando para el 02 de abril de 2024

