

(1) Fecha informe: 05/06/2020

(2) Tipo de trabajo:



Periodo que reporta: al 31 de mayo de 2020

**Proyecto: "REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS"**

<b>(5) Unidad encargada</b>	<b>UNIDAD EJECUTORA RIO SIXAOLA</b>
<b>Encargado</b>	Greivin Jiménez Esquivel
<b>Teléfono / Correo</b>	88820-7901; greivin.jimenez@conavi.go.cr
<b>Fuente Financiamiento</b>	Fondo Vial CONAVI
<b>Contratista/Supervisora</b>	Constructora Hernán Solís / Consorcio GINPROSA-DICCOG-LGC (pendiente firma de contratos)

Descripción: Rehabilitación de un tramo de 2,2 km, en tramos de cuatro a siete carriles, con mejores condiciones de servicio, realizando ampliación de pasos en Quebradas, ampliación de Puentes, inclusión de servicios públicos, mejoras en intersecciones

<b>(7) PLAZO</b>	Orden de Inicio	2/5/2017	<b>45%</b>
	Plazo contractual (PC)	23 meses	
	Eventos compens. (EC)	15,5 meses	
	Plazo por suspensión (PS)	0 meses	
	Plazos OM (POM)	33,5 meses	
	Plazo total (PC+EC+POM)	72 meses	
	Última suspensión	N/A	
	<b>Plazo utilizado</b>	<b>32,5 meses</b>	<b>% Avance</b>
<b>Fecha de Finalización</b>	<b>2/5/2023</b>		

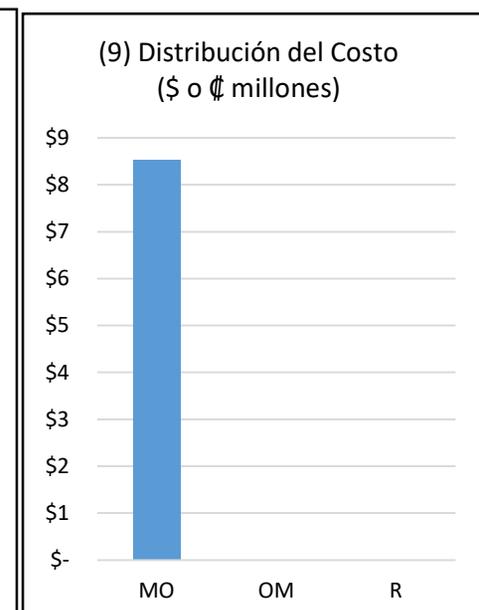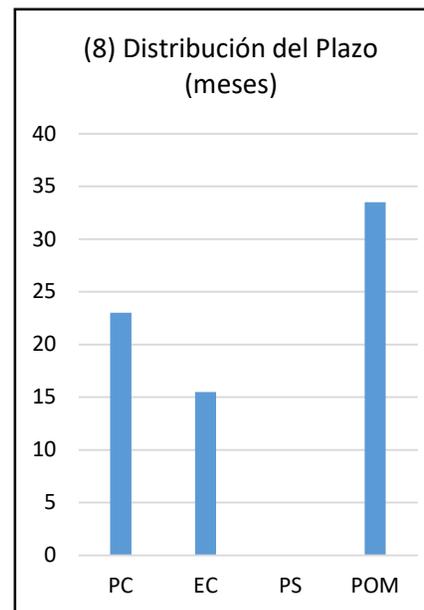

<b>(8) COSTO</b>	Monto de oferta (MO)	\$ 8.539.322,00	<b>26%</b>
	Orden Modificación (OM)	\$ -	
	Reajustes (R)	\$ -	
	<b>Monto total (MO+OM+R)</b>	<b>\$ 8.539.322,00</b>	<b>% Ejec.</b>
	<b>Financiero Ejec.</b>	<b>\$ 2.200.000,00</b>	
<b>Pendiente de pago (PP)</b>	<b>\$ 6.339.322,00</b>		

**(9) Consideraciones relevantes**

**(10) Elaborado y aprobado por:**

Los datos financieros corresponden a los del informe al 30 de abril de 2020, ya que a la fecha de este reporte la UNOPS no ha remitido el informe de seguimiento mensual (UNOPS tiene hasta 10 días hábiles para hacer la presentación de los informes). En el mes de mayo se logró la aprobación por parte del Consejo de Administración de la Adenda No.3, sin embargo hasta que la CGR realice el respectivo refrendo de la Adenda No.3 se actualizará la información de costo del proyecto y el respectivo gráfico de avance financiero.

Ing. Jaime Mas Romero  
Lic. Mario Sánchez Ramírez  
  
Gerente:  
Ing. Greivin Jiménez Esquivel MAP.

(4) Estado del proyecto:

(1) Fecha informe: 05/06/2020

Periodo que reporta: al 31 de mayo de 2020

**Proyecto: "REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS"**

(9) Consideraciones relevantes

Mediante Comunicado de Acuerdo ACA 1-20-280 (74) del 22 de mayo de 2020 según el Acuerdo No.5 del Acta 35-2020 el Consejo de Administración autoriza la Adenda No. 3 al Memorándum de Acuerdo entre el CONAVI y UNOPS al proyecto: "Revisión de Diseños, Construcción y Supervisión de Obras de Ampliación de la Ruta Nacional 147 (Radial Lindora) y Obras Conexas", y se instruye a la Unidad Ejecutora para que gestione la formalización de las firmas y su remisión a la Contraloría General de la República para el refrendo correspondiente.

Durante el mes de junio se presentará ante la Contraloría General de la República la Adenda No.3 para el refrendo respectivo:

En la Adenda No.3 se reflejarán los costos directos de la construcción de la obra y de personal, operativos, de soporte e indirectos incurridos durante los treinta y tres (33.50) meses que son objeto de ampliación en la Adenda No.2, así como las actividades adicionales o actualizadas con impacto en el plazo y monto del proyecto fuera de lo que es estrictamente la ampliación del plazo.

El ajuste de la Adenda No.3 es por US \$10 335 825,00 adicionales, para un total de US \$18 911 508,00.


A la fecha se ha trasladado a la UNOPS US \$2 200 000,00, para el año presupuestario 2020 se requieren US \$11 600 000,00, para el periodo 2021 se ocupan US\$4 564 356 y para el inicio del periodo 2022 se ocupan US \$547 198,00.

(4) Estado del proyecto:


(1) Fecha informe: 05/06/2020

Periodo que reporta: al 31 de mayo de 2020

### “REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

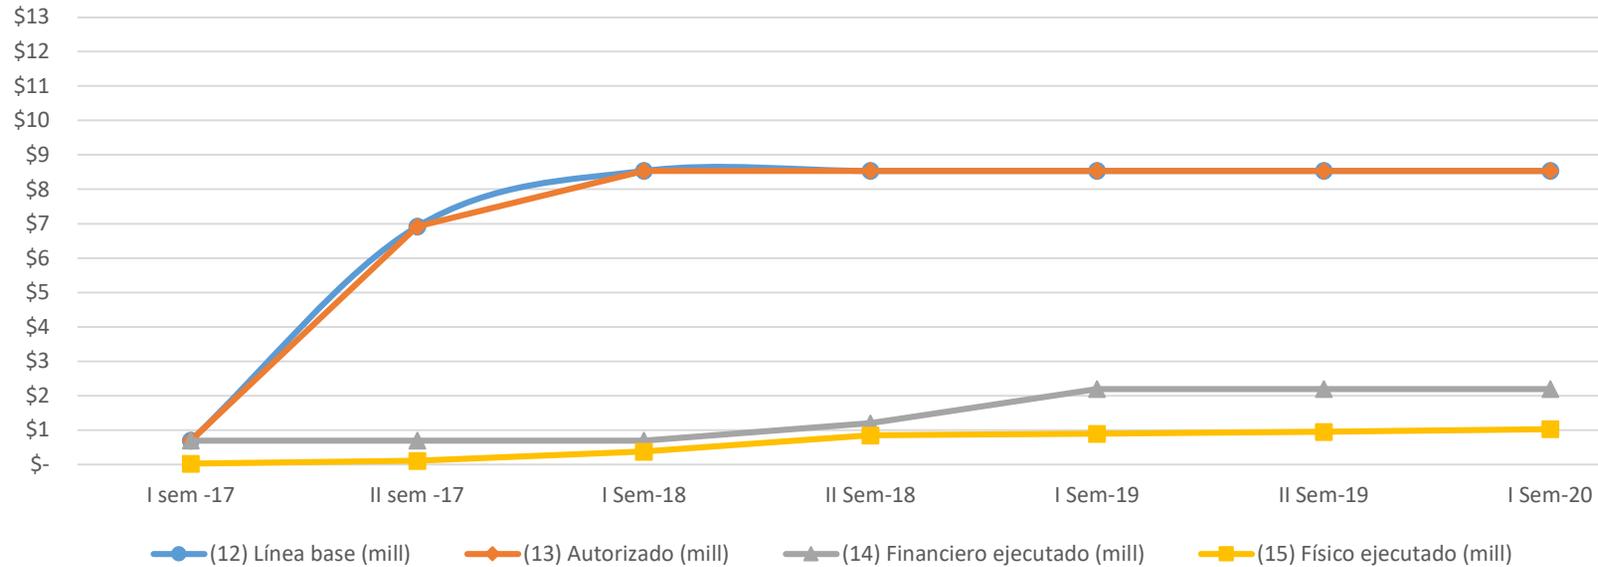

#### Flujo de desembolsos

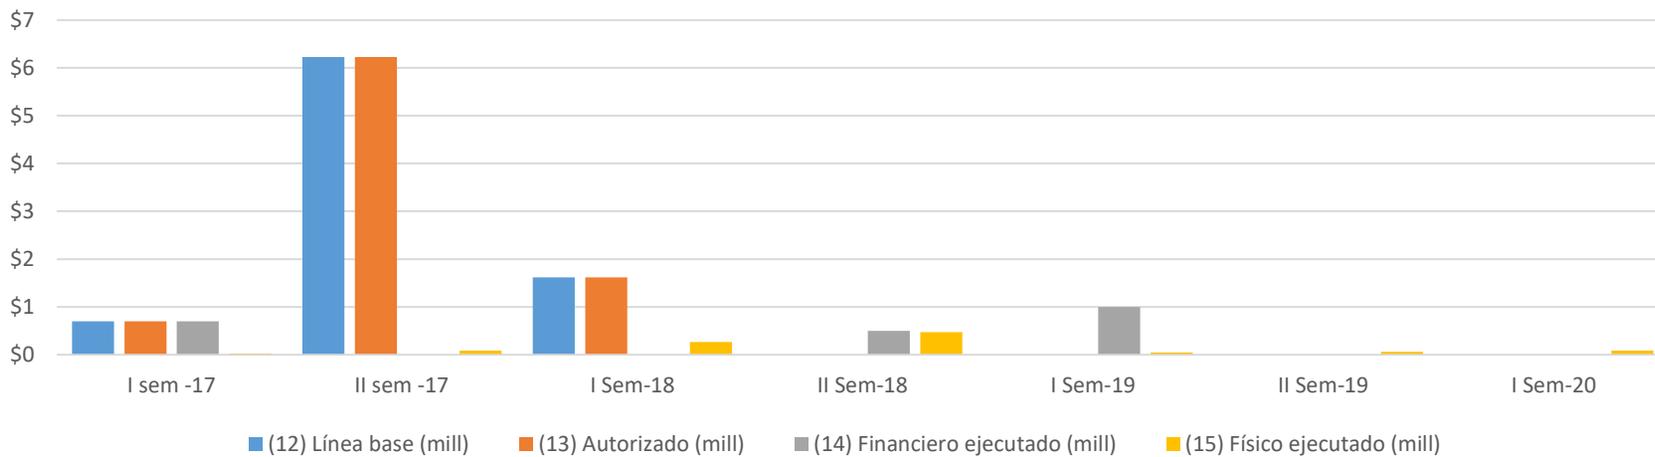


(4) Estado del proyecto:

(1) Fecha informe: 05/06/2020

Periodo que reporta: al 31 de mayo de 2020

## “REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”

### Escala de tiempo del

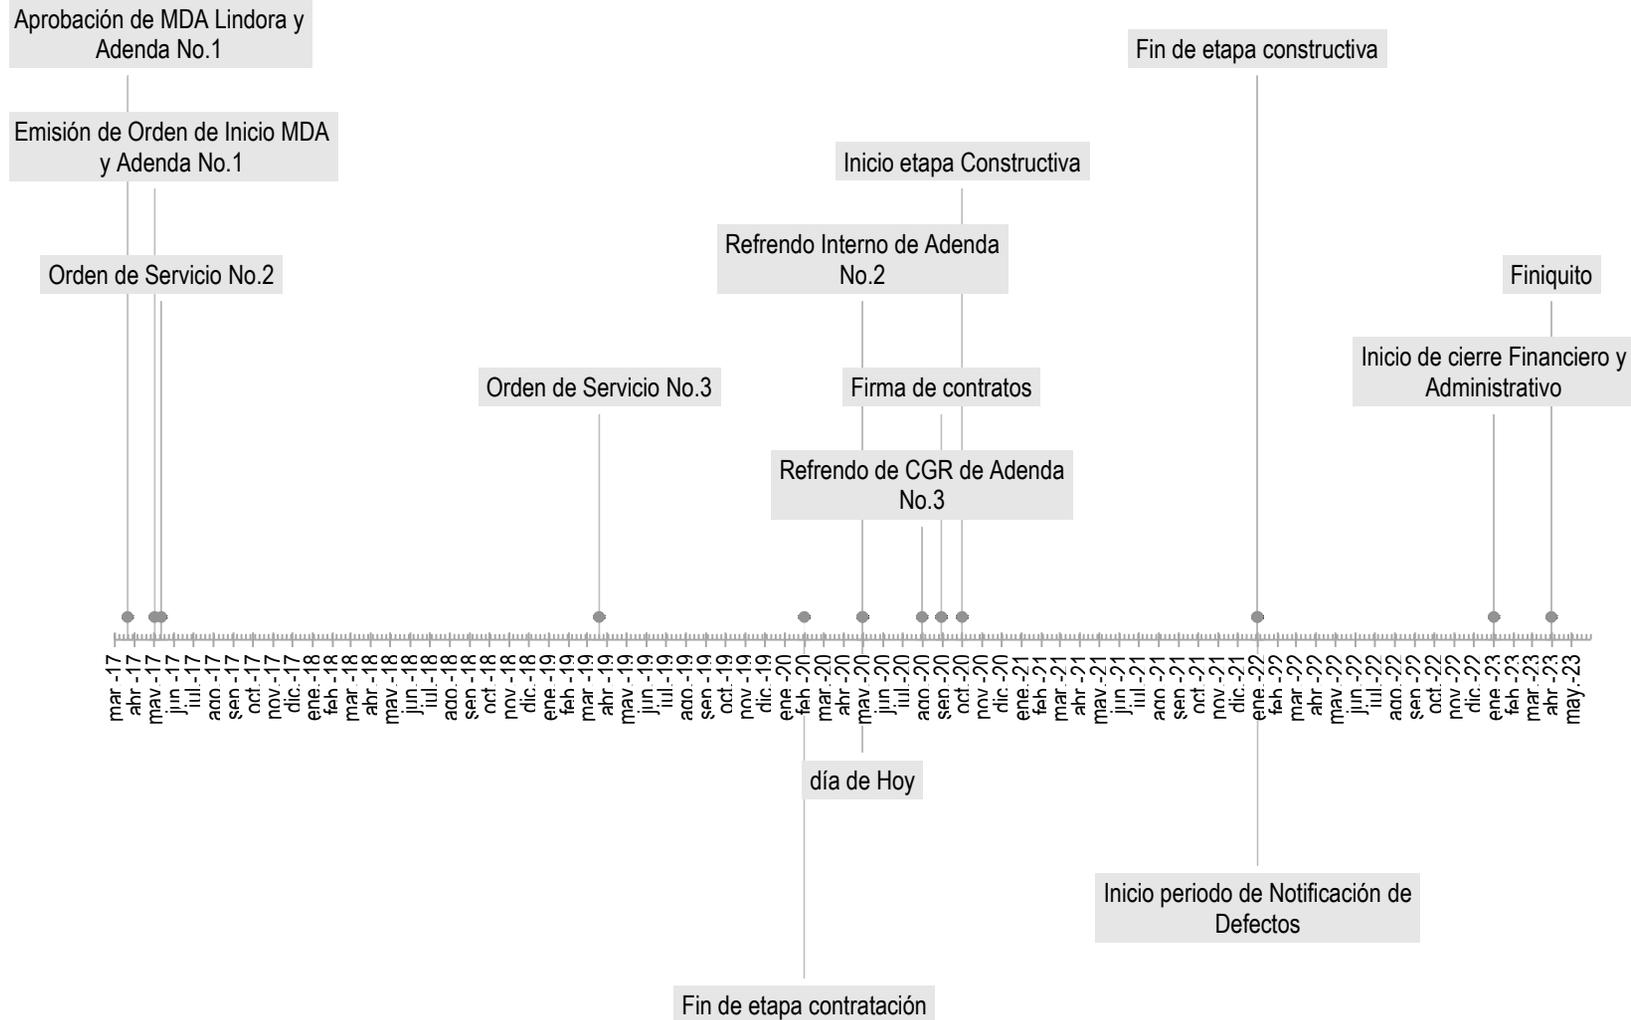

### Ruta Crítica del proyecto

(4) Estado del proyecto:

(1)Fecha informe: 05/06/2020

Periodo que reporta: al 31 de mayo de 2020

**“REVISIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA RUTA NACIONAL 147 (RADIAL LINDORA) Y OBRAS CONEXAS”**

**Control de Órdenes de Modificación y Órdenes de Servicio**

(16)Tipo de orden, número y fecha	(17) Modificación en Tiempo		(18) Modificación en Costo		(19) Estado Actual
	Incremento	Razón	Incremento	Razón	
Orden de Servicio No1. Inicio de Labores	0	Se emite la Orden de Iniciar Labores	NO	No Aplica	Inicio de Labores apartir del 02 de mayo de 2017 con fecha final el 2 de abril de 2019
Orden de Servicio No.2 del 12 de mayo de 2017	16 días	Evento compensable relacinado con tiempo transcurrido entre OS No.1 y Transferencia de fondos	NO	No Aplica	Ajusta fecha final del MdA al 18 de abril de 2019
Orden de Servicio No.3- con fecha del 20 de marzo del 2019	15 meses	Evento compensable relacionado con el proceso de revisión de diseños	NO	No Aplica	Ajusta fecha final del MdA al 18 de julio de 2019
Adenda No.2	33.5 meses	Ampliación de plazo hasta 72 meses, para continuar con la fase de modificación contractual, la fase constructiva y cierre del MdA	NO	No Aplica	Ajusta fecha final del MdA al 02 de mayo de 2023
Adenda No.3			US\$10 335 825,00	Modificación e inclusión de actividades, ajuste del presupuesto del proyecto, que pasa de \$8.5 millones a \$18.9 millones	Pendiente de Refrendo por parte de CGR

(4) Estado del proyecto:
